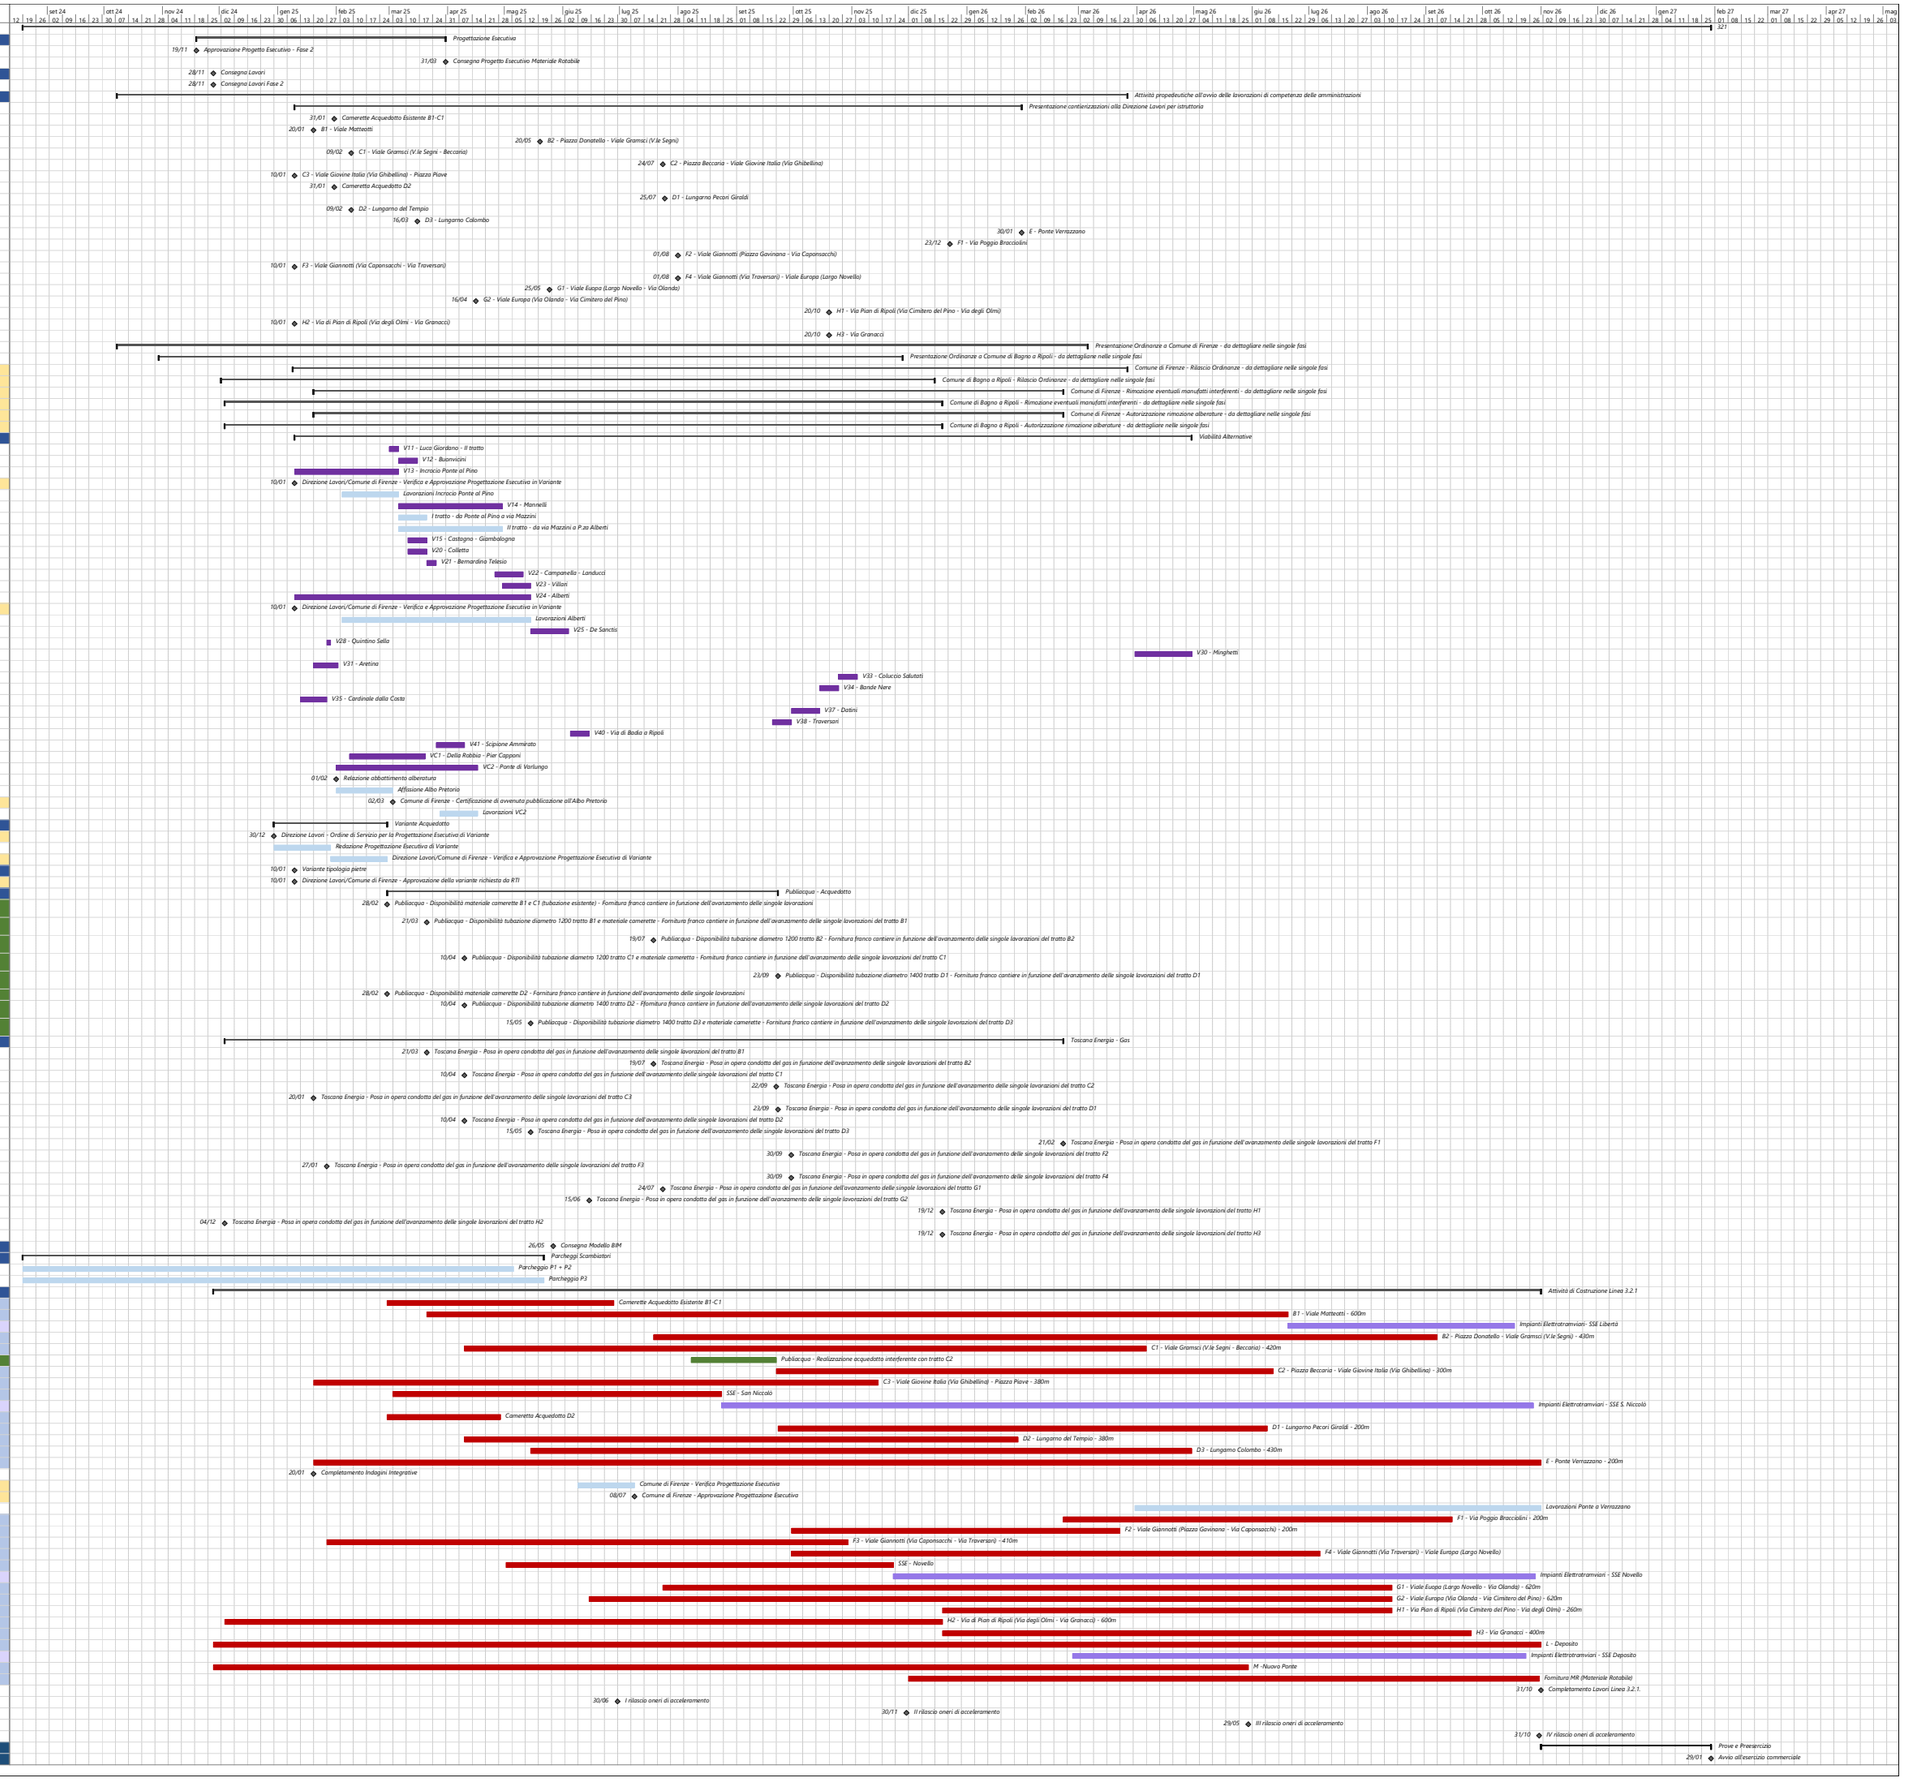ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**321**	**894 g**	**lun 19/08/24**	**ven 29/01/27**
2	**Progettazione Esecutiva**	**132 g**	**mar 19/11/24**	**lun 31/03/25**
3	Approvazione Progetto Esecutivo - Fase 2	0 g	mar 19/11/24	mar 19/11/24
4	Consegna Progetto Esecutivo Materiale Rotabile	0 g	lun 31/03/25	lun 31/03/25
5	**Consegna Lavori**	**0 g**	**gio 28/11/24**	**gio 28/11/24**
6	Consegna Lavori Fase 2	0 g	gio 28/11/24	gio 28/11/24
7	**Attività propedeutiche all'avvio delle lavorazioni di competenza delle amministrazioni**	**535 g**	**mar 08/10/24**	**ven 27/02/26**
8	***Presentazione cantierizzazioni alla Direzione Lavori per istruttoria***	**385 g**	**ven 10/01/25**	**ven 30/01/26**
9	Camerette Acquedotto Esistente B1-C1	0 g	ven 31/01/25	ven 31/01/25
10	B1 - Viale Matteotti	0 g	lun 20/01/25	lun 20/01/25
11	B2 - Piazza Donatello - Viale Gramsci (V.le Segni)	0 g	mar 20/05/25	mar 20/05/25
12	C1 - Viale Gramsci (V.le Segni - Beccaria)	0 g	dom 09/02/25	dom 09/02/25
13	C2 - Piazza Beccaria - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina)	0 g	gio 24/07/25	gio 24/07/25
14	C3 - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina) - Piazza Piave	0 g	ven 10/01/25	ven 10/01/25
15	Cameretta Acquedotto D2	0 g	ven 31/01/25	ven 31/01/25
16	D1 - Lungarno Pecori Giraldi	0 g	ven 25/07/25	ven 25/07/25
17	D2 - Lungarno del Tempio	0 g	dom 09/02/25	dom 09/02/25
18	D3 - Lungarno Colombo	0 g	dom 16/03/25	dom 16/03/25
19	E - Ponte Verrazzano	0 g	ven 30/01/26	ven 30/01/26
20	F1 - Via Poggio Bracciolini	0 g	mar 23/12/25	mar 23/12/25
21	F2 - Viale Giannotti (Piazza Gavinana - Via Caponsacchi)	0 g	ven 01/08/25	ven 01/08/25
22	F3 - Viale Giannotti (Via Caponsacchi - Via Traversari)	0 g	ven 10/01/25	ven 10/01/25
23	F4 - Viale Giannotti (Via Traversari) - Viale Europa (Largo Novello)	0 g	ven 01/08/25	ven 01/08/25
24	G1 - Viale Euopa (Largo Novello - Via Olanda)	0 g	dom 25/05/25	dom 25/05/25
25	G2 - Viale Europa (Via Olanda - Via Cimitero del Pino)	0 g	mer 16/04/25	mer 16/04/25
26	H1 - Via Pian di Ripoli (Via Cimitero del Pino - Via degli Olmi)	0 g	lun 20/10/25	lun 20/10/25
27	H2 - Via di Pian di Ripoli (Via degli Olmi - Via Granacci)	0 g	ven 10/01/25	ven 10/01/25
28	H3 - Via Granacci	0 g	lun 20/10/25	lun 20/10/25
29	***Presentazione Ordinanze a Comune di Firenze - da dettagliare nelle singole fasi***	**514 g**	**mar 08/10/24**	**ven 06/03/26**
70	***Presentazione Ordinanze a Comune di Bagno a Ripoli - da dettagliare nelle singole fasi***	**394 g**	**mer 30/10/24**	**ven 28/11/25**
74	***Comune di Firenze - Rilascio Ordinanze - da dettagliare nelle singole fasi***	**442 g**	**gio 09/01/25**	**ven 27/03/26**
113	***Comune di Bagno a Ripoli - Rilascio Ordinanze - da dettagliare nelle singole fasi***	**378 g**	**lun 02/12/24**	**lun 15/12/25**
117	***Comune di Firenze - Rimozione eventuali manufatti interferenti - da dettagliare nelle singole fasi***	**397 g**	**lun 20/01/25**	**sab 21/02/26**
132	***Comune di Bagno a Ripoli - Rimozione eventuali manufatti interferenti - da dettagliare nelle singole fasi***	**380 g**	**mer 04/12/24**	**ven 19/12/25**
136	***Comune di Firenze - Autorizzazione rimozione alberature - da dettagliare nelle singole fasi***	**397 g**	**lun 20/01/25**	**sab 21/02/26**
151	***Comune di Bagno a Ripoli - Autorizzazione rimozione alberature - da dettagliare nelle singole fasi***	**380 g**	**mer 04/12/24**	**ven 19/12/25**
155	**Viabilità Alternative**	**475 g**	**ven 10/01/25**	**mer 29/04/26**
156	V11 - Luca Giordano - II tratto	5 g	sab 01/03/25	mer 05/03/25
157	V12 - Buonvicini	10 g	gio 06/03/25	sab 15/03/25
158	**V13 - Incrocio Ponte al Pino**	**55 g**	**ven 10/01/25**	**mer 05/03/25**
159	***Direzione Lavori/Comune di Firenze - Verifica e Approvazione Progettazione Esecutiva in Variante***	***0 g***	***ven 10/01/25***	***ven 10/01/25***
160	Lavorazioni Incrocio Ponte al Pino	30 g	mar 04/02/25	mer 05/03/25
161	**V14 - Mannelli**	**55 g**	**gio 06/03/25**	**mar 29/04/25**
162	I tratto - da Ponte al Pino a via Mazzini	15 g	gio 06/03/25	gio 20/03/25
163	II tratto - da via Mazzini a P.za Alberti	55 g	gio 06/03/25	mar 29/04/25
164	V15 - Castagno - Giambologna	10 g	mar 11/03/25	gio 20/03/25
165	V20 - Colletta	10 g	mar 11/03/25	ven 21/03/25
166	V21 - Bernardino Telesio	5 g	ven 21/03/25	mar 25/03/25
167	V22 - Campanella - Landucci	15 g	sab 26/04/25	sab 10/05/25
168	V23 - Villari	15 g	mer 30/04/25	mer 14/05/25
169	**V24 - Alberti**	**125 g**	**ven 10/01/25**	**mer 14/05/25**
170	***Direzione Lavori/Comune di Firenze - Verifica e Approvazione Progettazione Esecutiva in Variante***	***0 g***	***ven 10/01/25***	***ven 10/01/25***
171	Lavorazioni Alberti	100 g	mar 04/02/25	mer 14/05/25
172	V25 - De Sanctis	20 g	gio 15/05/25	mar 03/06/25
173	V28 - Quintino Sella	2 g	lun 27/01/25	mar 28/01/25
174	V30 - Minghetti	30 g	mar 31/03/26	mer 29/04/26
175	V31 - Aretina	13 g	lun 20/01/25	sab 01/02/25
176	V33 - Coluccio Salutati	10 g	sab 25/10/25	lun 03/11/25
177	V34 - Bande Nere	10 g	mer 15/10/25	ven 24/10/25
178	V35 - Cardinale dalla Costa	14 g	lun 13/01/25	dom 26/01/25
179	V37 - Datini	15 g	mar 30/09/25	mar 14/10/25
180	V38 - Traversari	10 g	sab 20/09/25	mar 30/09/25
181	V40 - Via di Badia a Ripoli	10 g	gio 05/06/25	dom 15/06/25
182	V41 - Scipione Ammirato	15 g	mer 26/03/25	mer 09/04/25
183	VC1 - Della Robbia - Pier Capponi	40 g	sab 08/02/25	gio 20/03/25
184	**VC2 - Ponte di Varlungo**	**75 g**	**sab 01/02/25**	**mer 16/04/25**
185	Relazione abbattimento alberatura	0 g	sab 01/02/25	sab 01/02/25
186	Affissione Albo Pretorio	30 g	sab 01/02/25	dom 02/03/25
187	***Comune di Firenze - Certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio***	***0 g***	***dom 02/03/25***	***dom 02/03/25***
188	Lavorazioni VC2	20 g	ven 28/03/25	mer 16/04/25
189	**Variante Acquedotto**	**60 g**	**lun 30/12/24**	**gio 27/02/25**
190	***Direzione Lavori - Ordine di Servizio per la Progettazione Esecutiva di Variante***	***0 g***	***lun 30/12/24***	***lun 30/12/24***
191	Redazione Progettazione Esecutiva di Variante	30 g	lun 30/12/24	mar 28/01/25
192	***Direzione Lavori/Comune di Firenze - Verifica e Approvazione Progettazione Esecutiva di Variante***	***30 g***	***mer 29/01/25***	***gio 27/02/25***
193	**Variante tipologia pietre**	**0 g**	**ven 10/01/25**	**ven 10/01/25**
194	***Direzione Lavori/Comune di Firenze - Approvazione della variante richiesta da RTI***	***0 g***	***ven 10/01/25***	***ven 10/01/25***
195	**Publiacqua - Acquedotto**	**207 g**	**ven 28/02/25**	**mar 23/09/25**
196	***Publiacqua - Disponibilità materiale camerette B1 e C1 (tubazione esistente) - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni***	***0 g***	***ven 28/02/25***	***ven 28/02/25***
197	***Publiacqua - Disponibilità tubazione diametro 1200 tratto B1 e materiale camerette - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto B1***	***0 g***	***ven 21/03/25***	***ven 21/03/25***
198	***Publiacqua - Disponibilità tubazione diametro 1200 tratto B2 - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto B2***	***0 g***	***sab 19/07/25***	***sab 19/07/25***
199	***Publiacqua - Disponibilità tubazione diametro 1200 tratto C1 e materiale camerette - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto C1***	***0 g***	***gio 10/04/25***	***gio 10/04/25***
200	***Publiacqua - Disponibilità tubazione diametro 1400 tratto D1 - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto D1***	***0 g***	***mar 23/09/25***	***mar 23/09/25***
201	***Publiacqua - Disponibilità materiale camerette D2 - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni***	***0 g***	***ven 28/02/25***	***ven 28/02/25***
202	***Publiacqua - Disponibilità tubazione diametro 1400 tratto D2 - Ffornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto D2***	***0 g***	***gio 10/04/25***	***gio 10/04/25***
203	***Publiacqua - Disponibilità tubazione diametro 1400 tratto D3 e materiale camerette - Fornitura franco cantiere in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto D3***	***0 g***	***gio 15/05/25***	***gio 15/05/25***
204	**Toscana Energia - Gas**	**644 g**	**mer 04/12/24**	**sab 21/02/26**
205	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto B1	0 g	ven 21/03/25	ven 21/03/25
206	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto B2	0 g	sab 19/07/25	sab 19/07/25
207	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto C1	0 g	gio 10/04/25	gio 10/04/25
208	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto C2	0 g	lun 22/09/25	lun 22/09/25
209	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto C3	0 g	lun 20/01/25	lun 20/01/25
210	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto D1	0 g	mar 23/09/25	mar 23/09/25
211	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto D2	0 g	gio 10/04/25	gio 10/04/25
212	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto D3	0 g	gio 15/05/25	gio 15/05/25
213	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto F1	0 g	sab 21/02/26	sab 21/02/26
214	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto F2	0 g	mar 30/09/25	mar 30/09/25
215	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto F3	0 g	lun 27/01/25	lun 27/01/25
216	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto F4	0 g	mar 30/09/25	mar 30/09/25
217	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto G1	0 g	gio 24/07/25	gio 24/07/25
218	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto G2	0 g	dom 15/06/25	dom 15/06/25
219	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto H1	0 g	ven 19/12/25	ven 19/12/25
220	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto H2	0 g	mer 04/11/24	mer 04/11/24
221	Toscana Energia - Posa in opera condotta del gas in funzione dell'avanzamento delle singole lavorazioni del tratto H3	0 g	ven 19/12/25	ven 19/12/25
222	**Consegna Modello BIM**	**0 g**	**lun 26/05/25**	**lun 26/05/25**
223	**Parcheggi Scambiatori**	**276 g**	**lun 19/08/24**	**mer 21/05/25**
224	Parcheggio P1 + P2	260 g	lun 19/08/24	lun 05/05/25
225	Parcheggio P3	276 g	lun 19/08/24	mer 21/05/25
226	**Attività di Costruzione Linea 3.2.1**	**703 g**	**gio 28/11/24**	**sab 31/10/26**
227	**Camerette Acquedotto Esistente B1-C1**	**120 g**	**ven 28/02/25**	**ven 27/06/25**
231	**B1 - Viale Matteotti - 600m**	**456 g**	**ven 21/03/25**	**ven 19/06/26**
232	**Impianti Elettrotramviari- SSE Libertà**	**120 g**	**sab 20/06/26**	**sab 17/10/26**
233	**B2 - Piazza Donatello - Viale Gramsci (V.le Segni) - 430m**	**415 g**	**sab 19/07/25**	**dom 06/09/26**
234	**C1 - Viale Gramsci (V.le Segni - Beccaria) - 420m**	**361 g**	**gio 10/04/25**	**dom 05/04/26**
235	***Publiacqua - Realizzazione acquedotto interferente con tratto C2***	***45 g***	***ven 08/08/25***	***dom 21/09/25***
236	**C2 - Piazza Beccaria - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina) - 300m**	**263 g**	**lun 22/09/25**	**gio 11/06/26**
237	**C3 - Viale Giovine Italia (Via Ghibellina) - Piazza Piave - 380m**	**299 g**	**lun 20/01/25**	**ven 14/11/25**
238	**SSE - San Niccolò**	**174 g**	**lun 03/03/25**	**sab 23/08/25**
239	**Impianti Elettrotramviari - SSE S. Niccolò**	**430 g**	**dom 24/08/25**	**mar 27/10/26**
242	**Cameretta Acquedotto D2**	**60 g**	**ven 28/02/25**	**lun 28/04/25**
243	**D1 - Lungarno Pecori Giraldi - 200m**	**259 g**	**mar 23/09/25**	**lun 08/06/26**
244	**D2 - Lungarno del Tempio - 380m**	**293 g**	**gio 10/04/25**	**mar 27/01/26**
245	**D3 - Lungarno Colombo - 430m**	**350 g**	**gio 15/05/25**	**mer 29/04/26**
246	**E - Ponte Verrazzano - 200m**	**650 g**	**lun 20/01/25**	**sab 31/10/26**
247	Completamento Indagini Integrative	0 g	lun 20/01/25	lun 20/01/25
248	***Comune di Firenze - Verifica Progettazione Esecutiva***	***30 g***	***lun 09/06/25***	***mar 08/07/25***
249	***Comune di Firenze - Approvazione Progettazione Esecutiva***	***0 g***	***mar 08/07/25***	***mar 08/07/25***
250	Lavorazioni Ponte a Verrazzano	215 g	mar 31/03/26	sab 31/10/26
251	**F1 - Via Poggio Bracciolini - 200m**	**206 g**	**sab 21/02/26**	**lun 14/09/26**
252	**F2 - Viale Giannotti (Piazza Gavinana - Via Caponsacchi) - 200m**	**174 g**	**mar 30/09/25**	**dom 22/03/26**
253	**F3 - Viale Giannotti (Via Caponsacchi - Via Traversari) - 410m**	**276 g**	**lun 27/01/25**	**mer 29/10/25**
254	**F4 - Viale Giannotti (Via Traversari) - Viale Europa (Largo Novello)**	**280 g**	**mar 30/09/25**	**lun 06/07/26**
255	**SSE - Novello**	**205 g**	**ven 02/05/25**	**sab 22/11/25**
256	**Impianti Elettrotramviari - SSE Novello**	**340 g**	**dom 23/11/25**	**mer 28/10/26**
257	**G1 - Viale Europa (Largo Novello - Via Olanda) - 620m**	**386 g**	**gio 24/07/25**	**gio 13/08/26**
258	**G2 - Viale Europa (Via Olanda - Via Cimitero del Pino) - 620m**	**425 g**	**dom 15/06/25**	**gio 13/08/26**
259	**H1 - Via Pian di Ripoli (Via Cimitero del Pino - Via degli Olmi) - 260m**	**238 g**	**ven 19/12/25**	**gio 13/08/26**
260	**H2 - Via di Pian di Ripoli (Via degli Olmi - Via Granacci) - 600m**	**380 g**	**mer 04/12/24**	**gio 18/12/25**
261	**H3 - Via Granacci - 400m**	**280 g**	**ven 19/12/25**	**gio 24/09/26**
262	**L - Deposito**	**703 g**	**gio 28/11/24**	**sab 31/10/26**
263	**Impianti Elettrotramviari - SSE Deposito**	**240 g**	**gio 26/02/26**	**ven 23/10/26**
264	**M -Nuovo Ponte**	**548 g**	**gio 28/11/24**	**ven 29/05/26**
265	**Fornitura MR (Materiale Rotabile)**	**334 g**	**lun 01/12/25**	**ven 30/10/26**
266	Completamento Lavori Linea 3.2.1.	0 g	sab 31/10/26	sab 31/10/26
267	I rilascio oneri di accelerramento	0 g	lun 30/06/25	lun 30/06/25
268	II rilascio oneri di accelerramento	0 g	dom 30/11/25	dom 30/11/25
269	III rilascio oneri di accelerramento	0 g	ven 29/05/26	ven 29/05/26
270	IV rilascio oneri di accelerramento	0 g	sab 31/10/26	sab 31/10/26
271	**Prove e Preesercizio**	**90 g**	**dom 01/11/26**	**ven 29/01/27**
272	**Avvio all'esercizio commerciale**	**0 g**	**ven 29/01/27**	**ven 29/01/27**
